



GAD MUNICIPAL DE
Gualaquiza

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS



Memorando No. GADMG-OO.PP-2019- 0627M

Gualaquiza, 26 de Agosto de 2019.

Ingeniero

Francis Pavón Sanmartín

Alcalde del Gobierno Municipal de Gualaquiza

En su Despacho.

26 AGO 2019 11:50

N° Registro..... Hora.....

Recibido por:.....

Asunto: Planilla única "ADECUACION AREA RECREATIVA ESCUELA VICTOR EMILIO ESTRADA"

Adjunto al presente remito a usted la planilla de única más de la obra "ADECUACION AREA RECREATIVA ESCUELA VICTOR EMILIO ESTRADA" Adjudicada al Sr. Luis Israel Guambaña Aucay., la misma que asciende al valor de:

TOTAL PLANILLADO \$ 1.069,40 USD

Por la atención que sabrá dar a la presente me suscribo de Usted,

Atentamente,



Ing. Rómulo Fernán Calle Guzmán
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RC/ca

Ing. Francis Pavón Sanmartín
ALCALDE

AUTORIZA EL PAGO

DIRECCION FINANCIERA

Gualaquiza, 26 de Agosto de 2019

GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA



FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE OBRA



001006

UNICA. DEFIN. PROV.

TIPO:

X		
---	--	--

Señor

Gualaquiza, a 04 de Enero de 2019.

ALCALDE DEL CANTÓN

Ciudad

De mi consideración

Yo, Luis Israel Gambaña Aucay

En calidad del contratista del GAD Municipal de Gualaquiza para ejecutar la obra: _____


Adecuación Area Recreativa Escuela Victor Emilio
Estroza

Solicito se realice la recepción de los trabajos a mí encomendados.


CONTRATISTA

Fecha de presentación de solicitud: 04 de ENERO de 20 19




SECRETARIA GENERAL

07/01/2019
Jos. Pablo Frican
Recepción Recreación
[Signature]

Señor


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Su Despacho

Señor Director:

Proceda a realizar o disponer la inspección y recepción de los trabajos de acuerdo a la presente solicitud.




ALCALDE DEL CANTÓN

001008

FECHA DE RECIBO

X

El presente documento se emite en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 05 días del mes de Enero del 2010.

ALCALDE DEL CANTON

Ciudad

Delm consideracion

Señor Luis Israel Guadalupe Páez

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 05 días del mes de Enero del 2010.

Señor Director de Obras Públicas Municipales
Cantón Guayaquil

Señor Director de Obras Públicas Municipales

[Signature]

SECRETARIA GENERAL

ENERO

04

Fecha de presentación de solicitud

[Signature]

SECRETARIA GENERAL



Señor

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

En Guayaquil

Señor Director

Proceda a recibir la obra en el momento de la recepción y expedir los trabajos de acuerdo a lo presente en el presente documento.

[Signature]

ALCALDE DEL CANTON

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA

POR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE: "ADECUACION AREA RECREATIVA ESCUELA VICTOR EMILIO ESTRADA" SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA Y EL SR. LUIS ISRAEL GUAMBAÑA AUCAY.

En la ciudad de Gualaquiza, a los diecisiete días del mes de enero de dos mil diecinueve, intervienen por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gualaquiza, representada por el Ing. Rómulo Calle G., Director de Obras Públicas, Ing. Pablo Faican Cabrera, Técnico delegado y el Ingeniero Bryan Barzallo U. Técnico Observador para la recepción de la mencionada obra; y, por otra el **SR. LUIS ISRAEL GUAMBAÑA AUCAY**, en calidad de Contratista del Gobierno Municipal, con el objeto de suscribir la presente Acta de ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA, de acuerdo a las siguientes cláusulas.

PRIMERA. _ ANTECEDENTES.

En la ciudad de Gualaquiza a los siete días del mes de diciembre de dos mil dieciocho, se suscribe el contrato entre el GAD Municipal de Gualaquiza representada legalmente por el Ing. Patricio Ávila Choco, Alcalde; y, por otra parte, el **SR. LUIS ISRAEL GUAMBAÑA AUCAY**, en calidad de Contratista del Gobierno Municipal, mediante el cual el último de los comparecientes se compromete con el Gobierno Municipal, a la ejecución de la obra de: "ADECUACION AREA RECREATIVA ESCUELA VICTOR EMILIO ESTRADA".

El valor referencial de la obra de acuerdo al contrato original asciende a la cantidad de: MIL SETENTA CON 73/100 DÓLARES (\$1,070.73) sin el IVA de acuerdo a la Ley, de los cuales se cancelarán al contratista contra presentación de la planilla de ejecución de la obra, la que será debidamente aprobada por la Fiscalización. El plazo para la entrega de los trabajos, objeto del presente contrato, debidamente ejecutados y a satisfacción del Gobierno Municipal, fue fijado en treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de firma del contrato.

1.01. No existe contrato complementario.

1.02. El Director de Obras Públicas, luego de tomar a consideración el formulario de Recepción de obra No. 0001006 del cuatro de enero de dos mil diecinueve, comunica al señor contratista la realización de la Entrega - Recepción Definitiva.

SEGUNDA. - RECEPCIÓN:

Para este propósito la comisión revisa este contrato, las especificaciones técnicas, la planilla de pago y más documentos y realiza la inspección a los trabajos ejecutados en base a lo cual se establece lo siguiente:

2.01. El contratista ha realizado todos y cada uno de los rubros que constan en el contrato principal, y las planillas que se han elaborado para el efecto y de acuerdo a los anexos respectivos con sujeción a los planos, especificaciones e instrucciones proporcionados por el Gobierno Municipal, por lo cual, los trabajos se los considera satisfactorios.

2.02 El monto de los trabajos realizados por el contratista hasta la planilla N° 1 (liquidación) de obra civil es de: MIL, SESENTA Y NUEVE CON 40/100 DÓLARES (\$ 1,069.40) MAS EL IVA.

El pago se realizó de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLA N°	FECHA	MONTO TOTAL	IVA		DESCUENTOS				LÍQUIDO A PAGAR
			12.00%	TOTAL + IVA	IVA	ANTICIPO	MULTAS	ADM. DE LEY	
					30.00%				
1 de obra	17 enero de 2019	1,069.40	128.33	1,197.73	38.50	0.00	0.00	10.69	1,148.54
TOTALES		1,069.40		1,197.73	38.50	0.00		10.69	1,148.54

Los datos tomados de los archivos de Fiscalización corresponden a los valores planillados.

2.03 LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:

Se realizó de acuerdo al siguiente detalle:

- 2.03.1. Firma de contrato: siete (07) de diciembre de 2018.
- 2.03.2. Plazo contractual: treinta (30) Días calendario.
- 2.03.3. Plazo ampliación: cero (0) días calendario.
- 2.03.4. Solicitud de Recepción: cuatro (04) de enero de 2019.
- 2.03.5. Vencimiento del Plazo: seis (06) de enero de 2019.

De esta manera se determina que el contratista, ha terminado los trabajos encomendados dentro del plazo contractual en consecuencia, no se hace acreedor a multa por este concepto.

2.04 Observaciones: No existe ninguna observación hasta la presente recepción, si existiere problema en los trabajos ejecutados se le comunicará al contratista realice las reparaciones respectivas.

2.05 En base a los puntos anteriormente citados, los miembros de la Comisión convienen en dar por recibidos los trabajos realizados de manera definitiva. Por constancia de lo aquí actuado se firma en original y copias del mismo tenor y efecto en el día de su celebración.



Ing. Rómulo Calle G.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Ing. Luis Guambaña Aucay.
CONTRATISTA



Ing. Pablo Faican Cabrera.
TÉCNICO DELEGADO



Ing. Bryan Barzallo U.
TÉCNICO OBSERVADOR



INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRA



OBJETO DE CONTRATACIÓN:

ADECUACION AREA RECREATIVA ESCUELA VICTOR EMILIO ESTRADA

1.- PLANILLA No. **1** LIQUIDACIÓN
PERIODO DE EJECUCIÓN DESDE 07/12/2018 HASTA 04/01/2019

2.- ANTECEDENTES Y REFERENCIAS GENERALES

PARTIDA PRESU.: 07.03.36.362.750501.035.000.99999999.000
CONTRATISTA: SR. LUIS ISRAEL GUAMBAÑA AUCAY
MONTO: \$ 1,070.73
FISCALIZADOR: ING. BRYAN IVAN BARZALLO URGILES
ADMINISTRADOR: ING. ROMULO CALLE G.

AVANCE ECONÓMICO	99.88%
AVANCE FÍSICO	99.88%

ANTICIPO	0%	\$ 0.00
----------	----	---------

3.- RESUMEN DE PLAZOS

FIRMA DEL CONTRATO:	7 de diciembre de 2018	EL PLAZO INICIA A PARTIR DE:	FIRMA CONTRATO
ENTREGA ANTICIPO:		OTRA FECHA DE INICIO PLAZO	6 de enero de 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 Días	TERMINO CONTRACTUAL:	
AMPLIACIÓN DE PLAZO:		TERM. CON AMPLIA. Y SUSPEN:	4 de enero de 2019
SUPENSIONES		FECHA DE TERMINACION OBRA:	

4.- RESUMEN ECONÓMICO

PLANILLA	Anticipo	Planilla 1	Planilla 2	Planilla 3	Planilla 4	Planilla 5	Total
CONTRATO PRINCIPAL							\$ 1,069.40
OBRA CIVIL		\$ 1,069.40					\$ 0.00
REAJUSTE DE OBRA CIVIL							\$ 0.00
COSTO MAS PORCENTAJE							\$ 0.00
CONTRATO COMPLEMENTARIO							
TOTAL (dólares)	\$ 0.00	\$ 1,069.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,069.40

5.- MULTAS

	VALOR	% MULTA	VALOR
A.- DIAS FUERA DE PLAZO PLANILLAS			0
B.- INCUMPLIMIENTO AVANC. ECO (\$)	0.00	0.50%	0
C.- DIAS FUERA DEL PLAZO DE OBRA	0.00	0.10%	0
C.- DIAS INCUMPLIMIENTO ORDENES			0
TOTAL DE MULTAS			0.00

6.- ANALISIS DE CUMPLIMIENTO ECONÓMICO

PROGRAMADO 100%		EJECUTADO	
PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
1070.73	1070.73	\$ 1,069.40	\$ 1,069.40
100.00%	100.00%	99.88%	99.88%
INCUMPLIMIENTO REFERIDO A CURVA ACUMULADA DEL 80%			
PROGRAMADO	EJECUTADO	INCUMPL.	% INCUMPL.
856.58	1069.40	0.00	0.00%

7.- CONTROL DE CALIDAD

Se finalizan los trabajos de acuerdo al presupuesto, planos y especificaciones técnicas entregadas al contratista.

8.- RESUMEN ECONÓMICO DE PLANILLAS A CANCELAR EN ESTE PERIODO

DESCRIPCIÓN	Contrato Principal			Contrato Complementario		TOTAL
	OBRA N° 1	REAJUSTE PLANILLA	COSTO + % N°	OBRA	REAJUSTE	
VALOR OBRA CIVIL	\$ 1,069.40					\$ 1,069.40
VALOR PLANILLA	\$ 1,069.40					\$ 1,069.40
IVA:	12%	\$ 128.33				\$ 1,197.73
TOTAL		\$ 1,197.73				\$ 1,197.73
Descuentos						\$ 38.50
DESCUENTO IVA	30%	\$ 38.50				\$ 13.60
IMPUESTO A LA RENTA 1%		\$ 10.69				\$ 0.00
ANTICIPO	0%	\$ 0.00				\$ 0.00
MULTAS		\$ 0.00				\$ 0.00
TOTAL A PAGAR		\$ 1,148.54				\$ 1,148.54

Ing. Romulo Calle G.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Ing. Bryan I. Barzallo U.
FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 PLANILLA N° 1 DE EJECUCIÓN DE OBRA (LIQUIDACIÓN)



FECHA PLANILLA:
 OBRA:
 UBICACIÓN:
 No. CONTRATO:
 MONTO CONTRATO:
 MONTO ANTIPO:
 CONTRATISTA:
 FISCALIZADOR:
 PARTIDA PRESUPUESTARIA:

17 enero de 2019
 ADECUACION AREA RECREATIVA ESCUELA VICTOR EMILIO ESTRADA
 GUALAQUIZA
 34
 1,070.73 USD
 0.00 USD
 SR. LUIS ISRAEL GUAMBAÑA AUCAY
 INC. BRYAN IVAN BARZALLO URGILES
 07-03-36-362-750501-035-000-99999999-000

FECHA DE CONTRATO:
 FECHA DE ENTREGA DEL ANTIPO:
 FECHA DE INICIO DE LA OBRA:
 PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIOS):
 AMPLIACIONES DE PLAZO (DÍAS CALENDARIOS):
 FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO:
 FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CON AMPLIACIONES:
 FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA:
 DÍAS MULTA POR CRONOGRAMA:
 DÍAS MULTA POR PRESENTACIÓN DE PLANILLA:

07/12/2018
 07/12/2018
 30
 0
 06-ene-19
 04-ene-19

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL		EJECUTADO		IMPORTE		AVANCE		AUMENTO		DISMINUCIÓN		OBSERV.				
				P.UNITARIO	P.TOTAL	CANTIDADES		ACUM.ANT.	PRESENTES	TOT.FECHA	ACUM.ANT.	PRESENTES	TOT.FECHA	PRESENTE	TOTAL		CANT.	MONTO	CANT.	MONTO
						ACUM.ANT.	PRESENTES													
1,001	PICADO DE CONTRAPISO DE HS.	m ²	0.50	3.71	1.86	0.90	0.90	3.34	3.34	180.00%	180.00%	0.4	1.48	1.16	13.68					
1,002	EXCAVACION MANUAL EN SUELO (0-2m)	m ³	1.50	11.79	17.69	0.34	0.34	4.01	4.01	23.00%	23.00%									
1,003	ACERO ESTRUCTURAL	kg.	325.73	2.53	824.10	325.73	325.73	824.10	824.10	100.00%	100.00%	0.2	0.9							
1,004	PROV. E INST. DE VALLA MALLA ELECTROSOLDADA RB4.	m ²	43.00	4.51	193.93	43.20	43.20	194.83	194.83	100.00%	100.00%	0.06	9.95							
1,005	HORMIGON SIMPLE f'c=150 kg/cm ²	m ³	0.20	165.83	33.17	0.26	0.26	43.12	43.12	130.00%	130.00%		12.33		13.68					
SUBTOTAL					1,070.73			1,069.40	1,069.40											
TOTAL					1,070.73			1,069.40	1,069.40											

RESUMEN DE LA PLANILLA N°1 (LIQ.)		
DESCRIPCIÓN	ANTERIOR	TOTAL
PLANILLA OBRA CIVIL		1,069.40
VALOR IVA 12%		128.33
VALOR PLANILLA MAS IVA		1,197.73
DESC. DEL ANTIPO 0%		10.69
DESC. IMPUESTO A LA RENTA (1%)		38.50
DESC. 30% DEL 12% IVA		
MULTAS () DIA POR RETRASO DE TRABAJOS (1%)		
MULTA POR INCUMPLIMIENTO AVANC. ECO (1) (5%)		1,148.54
VALOR A PAGAR		1,148.54

3,33

ING. BRYAN IVAN BARZALLO URGILES
 FISCALIZADOR

[Firma]

SR. LUIS ISRAEL GUAMBAÑA AUCAY
 CONTRATISTA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA

MEMORIA DE CÁLCULO



OBRA: ADECUACION AREA RECREATIVA ESCUELA VICTOR EMILIO ESTRADA
 UBICACIÓN: GUALAQUIZA
 CONTRATISTA: SR. LUIS ISRAEL GUAMBAÑA AUCAY
 Planilla de Obra No.: PLANILLA N° 1 DE EJECUCIÓN DE OBRA (LIQUIDACIÓN)

RUBROS

1,001 PICADO DE CONTRAPISO DE HS.

LONGITUD	ANCHO	ALTURA	N° PIEZAS	CANTIDAD m ²	OBSERVACIONES
0.3	0.3		10	0.900	
			TOTAL	0.90	

1,002 EXCAVACION MANUAL EN SUELO (0-2)m

LONGITUD	ANCHO	ALTURA	N° PIEZAS	CANTIDAD m ³	OBSERVACIONES
0.25	0.25	0.55	10	0.344	
			TOTAL	0.34	

1,003 ACERO ESTRUCTURAL

LONGITUD	PESO ESPECIFICO	ALTURA	N° PIEZAS	CANTIDAD kg.	OBSERVACIONES
2.9	4.52		10	131.080	
2.4	2.29		18	98.928	
2.1	2.29		18	86.562	
0.25	2.29		16	9.160	
			TOTAL	325.73	

1,004 PROV. E INST. DE VALLA MALLA ELECTROSOLDADA R84.

LONGITUD	ANCHO	ALTURA	N° PIEZAS	CANTIDAD m ²	OBSERVACIONES
2.4		2	9	43.200	
			TOTAL	43.20	

1,005 HORMIGON SIMPLE f'c=180 kg/cm²

LONGITUD	ANCHO	ALTURA	N° PIEZAS	CANTIDAD m ³	OBSERVACIONES
0.23	0.23	0.5	10	0.26	
			TOTAL	0.26	





(3.3)

.....
 ING. BRYAN IVAN BARZALLO URGILES
 FISCALIZADOR

.....
 SR. LUIS ISRAEL GUAMBAÑA AUCAY
 CONTRATISTA



ANEXO FOTOGRAFICO

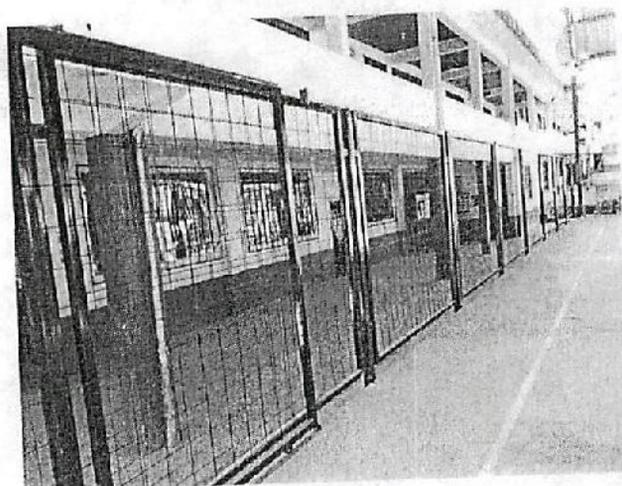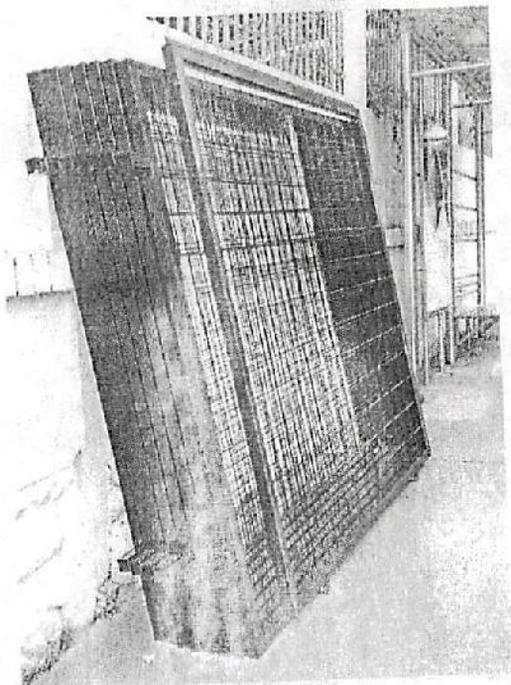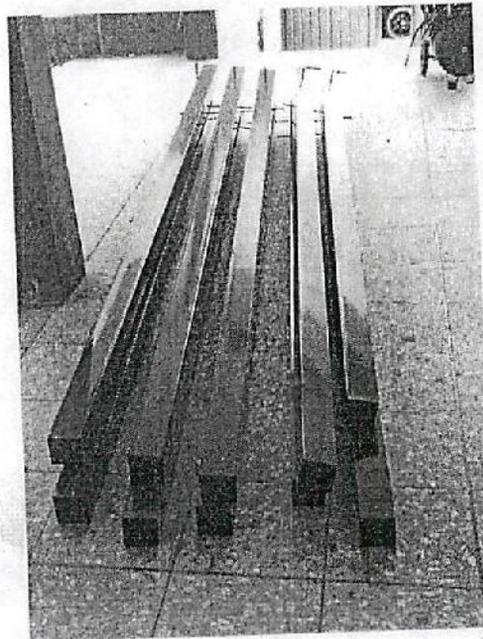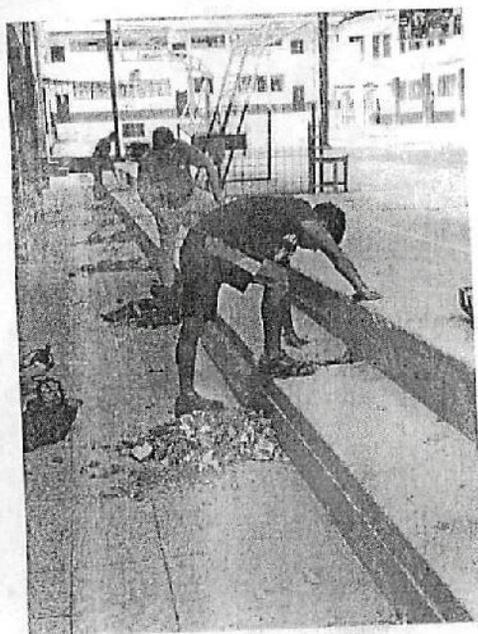

Ing. Bryan Ivan Barzallo Urgiles
FISCALIZADOR
